KOMTAS

DATA PLATFORM OPERATIONS SUPPORT

Blueprint v1 — iç referans, Damalink ve Digitallency doğrulaması için taslak

A Platform Health Check · B Transition · C Operate · Informatica, Teradata, BI, DWH modülleri · SLA ve hizmet kataloğu

1 **Konumlandırma ve ticari mantık**
Özet, ticari mantık, kanıt, hedef müşteriler ve tetikleyiciler, kapsam, migrasyon bağlantısı, kademeler.
s. 2 – 8

2 **Health Check ve monitoring**
A akışı ve takvimi, skorlama, standartlar ve kontrol noktaları, Monitoring Accelerator.
s. 9 – 12

3 **Transition ve operasyon**
B Transition, C hizmet modelleri, modüller, teknoloji seçenekleri, SLA ve hizmet kataloğu.
s. 13 – 18

4 **Delivery ve durum**
Ekip, boyutlandırma, acceptance, hızlandırıcılar, devam işleri, riskler, doğrulama özeti.
s. 19 – 25

Paket Özeti — Ne, Kimin İçin, Ne Zaman

KOMTAS

DWH, ETL ve BI ortamları için operasyon desteği: platform health check, monitoring, incident, change, performance ve capacity yönetimi, uzman kaynak modeli.

01 · ÖZET

PAKETİN ÇIKTILARI

Envanter ve health skoru
ortamlar, job'lar, raporlar, kullanıcılar; modül başına skor

Standart ve monitoring sonuçları
repository sorguları, kontrol noktaları, rule taraması

Yönetilen geçiş
knowledge transfer, runbook'lar, shadow, devir

SLA altında operasyon
incident, change, performance, capacity

Uzman kaynak modeli
saat havuzu, dedicated FTE veya hibrit

ÜÇ KADEME «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

A — Platform Health Check

envanter, standartlar, performance, monitoring taraması, skor, operasyon modeli önerisi

3–6 hafta, sabit bedel

B — Transition

knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, shadow

tek seferlik, sabit bedel

C — Operate

package, dedicated veya hybrid; Informatica, Teradata, BI, DWH modülleri

aylık, asgari 12 ay

DAYANAK — BİLİNEN BİLGİLER

- Damalink 04 Data Integration Framework: Data Integration Assessment ve PowerCenter Monitoring Accelerator
- Damalink materyali 2019–2021 tarihli; on-prem PowerCenter 10.x
- Digitallency sunumu: THY, Şişecam, Vodafone, SABB, Bank of Mısr ve STC-KSA operasyon referansları
- Digitallency Resourcing Hub: DWH / BI geliştirici, veri modelci, mimar, analist; Teradata outsourcing
- Talep sinyalleri: Allianz ADM managed services, Digiturk kaynak modeli, Odeabank sunucu taşıma
- Damalink ve Digitallency ile partnerlik modelleri henüz netleşmedi

Durum: taslak v1. Damalink framework materyali ve Digitallency referanslarından hazırlandı. Yöntem, rule, süre, efor, bant, SLA kalemi, rol ve acceptance ifadeleri, doğrulayacak tarafı gösteren turuncu etiket taşır (s. 25).

Ticari Mantık — Partnerlikler Açık

yalnızca iç kullanım

KOMTAS

Yalnızca iç kullanım. Partner koşulları, adıyla referanslar ve talep sinyalleri müşteri sunumunda ve teklif şablonlarında yer almaz.

DAMALINK İLE PARTNERLİK · AÇIK «DAMALINK DOĞRULASIN»

MADDE	DURUM
Delivery kapasitesi	«ALAN»
Yöntem, sorgu, checklist kullanımı	«ALAN»
Monitoring Accelerator kullanımı	«ALAN»
Gelir paylaşımı	«ALAN»
Teklif sahibi	«ALAN»

Digitallency. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Operasyon referanslarının ve Resourcing Hub rollerinin Komtaş tekliflerinde ve delivery'de kullanımı: «ALAN». Netleşene kadar müşteri dosyalarında yalnızca anonim ifade kullanılır.

DEĞER NEREDE

A Platform Health Check
sabit bedel; envanter, skor, operasyon modeli

↓

B Transition
tek seferlik; runbook, monitoring, shadow

↓

C Operate
aylık, tekrarlayan; hesap çapası

↓

Migrasyonlar
etl-migration-gcp; PowerCenter → IDMC

Talep sinyalleri. RFP klasörü: Allianz Data Office ADM managed services teknik şartnamesi; Digiturk kıdemli kaynak modeli; Odeabank Informatica sunucu taşıma. Referans değildir.

TİCARİ NOKTALAR

1. Tekrarlayan gelir; C sözleşmesi hesabı bağlar
2. Health Check envanteri legacy ETL → GCP ve PowerCenter → IDMC işini besler (lisans / IPU)
3. Birden fazla paket Run kademesi (Predictive, Data Privacy, MDM…) tek C sözleşmesinde toplanır
4. Körfez referansları (SABB, Bank of Mısr, STC) bölgesel bir anlatıyı destekler
5. Her hizmet modelinin fiyatlama yapısı «ALAN»

Körfez anlatısı. Körfez bölgesi ve Mısır'daki iki bankaya Teradata danışmanlık desteği ve Suudi Arabistan'daki outsource danışmanlık, operasyon desteği için bölgesel bir anlatı sağlar. Bu referansların kullanımı önce Digitallency ile netleştirilir.

Kanıt ve Kaynaklar

KOMTAS

Paketin bugün dayandığı bilgiler. Yalnızca iç kullanım: partnerler ve referanslar burada adıyla geçer; müşteri dosyalarında anonim referanslar kullanılır.

01 · KANIT

KAYNAKLAR

37 rule

Damalink — 04 Data Integration Framework

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Data Integration Assessment: yedi skorlu kategori, operasyonel ve governance repository sorguları, performance kontrol noktaları, deployment checklist'i, soru setleri. PowerCenter Monitoring Accelerator: 37 rule, veri modeli, dashboard'lar, alert'ler.

6 referans

Digitallency — operasyon referansları

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

THY DWH & BI operasyon desteği; Şişecam BI desteği; Vodafone Informatica desteği; SABB ve Bank of Mısr Teradata danışmanlık desteği; STC-KSA outsource danışmanlık; Resourcing Hub rolleri.

KAYNAK DURUMU

Damalink — assessment yöntemi yaklaşım, skorlama, sorgular, checklist'ler	kaynak
Damalink — Monitoring Accelerator 37 rule, veri modeli, yaklaşım	kaynak
Digitallency — operasyon referansları altı referans, Resourcing Hub	kaynak
İçerik tarihleri 2019–2021; on-prem PowerCenter 10.x	teyit edilecek
Komtaş tekliflerinde kullanım izin; partner veya Komtaş referansı	teyit edilecek
Komtaş'ın kendi referansı «REFERANS PROJE»	referans yok

Referans yılları, kapsamı ve sonuçları: sunumda yok «SONUÇ».
«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

BOŞLUKLAR VE FIRSAT

Eski materyal

Damalink içeriği 2019–2021 tarihli ve yalnızca on-prem PowerCenter 10.x'i kapsar; IDMC karşılıkları taslaktır (s. 16).

Partner IP'si ve referanslar

Damalink sorgu, checklist ve Monitoring Accelerator'ının ve Digitallency referanslarının Komtaş tekliflerinde kullanımı açıktır.

Migrasyonlara kapı

Health Check envanteri etl-migration-gcp ve PowerCenter → IDMC migrasyonunun girdisidir (s. 7).

Müşteri adlandırma. Müşteri dosyalarında: bir havayolu şirketi — DWH & BI operasyon desteği; bir üretim grubu — BI desteği; bir telekom operatörü — Informatica desteği; Körfez bölgesi ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği; Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık.

Hedef Müşteriler ve Tetikleyiciler

KOMTAS

Kime gidilir ve görüşmeyi hangi durumlar başlatır. Referanslardan ve talep sinyallerinden hazırlandı.

HEDEF MÜŞTERİ PROFİLLERİ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Banka ve sigorta
büyük DWH, yasal yüklemeler

Telekom
yüksek hacim, çok sayıda ETL job'ı

Havayolu ve üretim
her gün kullanılan DWH ve BI

Körfez bölgesi
Teradata ve outsource destek

TETİKLEYİCİLER «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Tedarikçi sözleşmesi bitiyor

mevcut destek sözleşmesi bitiyor veya yeniden ihale ediliyor.

Kilit personel ayrılıyor

platform bilgisi bir iki kişide.

Hatalı job'lar

sık job hatası, manuel restart.

Kaçan yükleme pencereleri

raporlar iş birimlerine geç ulaşıyor.

Denetim bulguları

operasyon, erişim veya change kontrolü bulguları.

Platform ömrü sonu

sürüm destek dışı; upgrade veya taşıma gerekli.

Maliyet baskısı

iç ekip veya tedarikçi maliyeti inceleniyor.

Planlı migrasyon

eski platform cut-over'a kadar stabil çalışmalı.

İlk görüşme. Platformlar ve sürümler, ortamlar, job ve rapor sayısı, mevcut ekip veya tedarikçi ve sözleşme bitişi, incident geçmişi, gereken destek penceresi, planlı migrasyon. Yanıtlar girdi formunu besler (dosya 3a).

Kapsam Sınırı — Ne Değildir

KOMTAS

Paketin yapmadığı işler ve içine almadan bağlandığı Komtaş paketleri.

01 · SINIR

KAPSAM DIŞI «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Altyapı ve donanım operasyonu
- İşletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA)
- Network
- Lisans yönetimi
- Minor enhancement havuzu dışındaki yeni geliştirme

DWH ASSESSMENT İLE SINIR

DWH Assessment hedefe, Health Check işletime bakar.

dwh-assessment mimariyi ve hedef durumu inceler. Health Check operasyoneldir: job'lar, schedule'lar, performance, monitoring, standartlar ve deployment. İkisi aynı platformda çalışabilir; bulgular paylaşılır, tekrarlanmaz.

İLGİLİ PAKETLER

etl-migration-gcp / IDMC Health Check envanteri migrasyon girdisidir (s. 7).

Paket Run kademeleri Predictive, Data Privacy, MDM, Regulatory Reporting, Datamart Run kademeleri C altına alınabilir.

dwh-assessment warehouse'un mimarisi ve hedef durumu.

Sınır kuralı. Altyapı, OS, DBA, network ve lisanslar: müşteri veya sağlayıcıları; opsiyonel kalem mümkün. Mimari ve hedef durum: dwh-assessment. Platformdan çıkış: migrasyon paketleri. Platformun SLA altında işletimi: bu paket.

Migrasyon Bağlantısı — etl-migration-gcp ve PowerCenter → IDMC

KOMTAS

Health Check envanteri ve bulguları migrasyonun girdisidir; C Operate, taşıma sürerken eski platformu işletebilir.

HEALTH CHECK → MİGRASYON «DAMALINK DOĞRULASIN»

HEALTH CHECK ÇIKTISI	İÇERİK	MİGRASYONDA KULLANIM
Envanter	workflow, session, mapping, job, schedule, rapor	legacy ETL → GCP veya IDMC için kapsam ve dalga planı
Standart bulguları	geçersiz, kullanılmayan ve tekrar eden nesneler	taşınacak, temizlenecek veya kaldırılacak olan
Performance bulguları	busy %, SQL override, pushdown kullanımı	hedef platform için tasarım noktaları
Bağımlılıklar	schedule'lar, yükleme zincirleri, kaynak ve hedefler	cut-over sırası
Monitoring rule'ları	rule seti ve threshold'lar	aynı kontroller hedefte yeniden kurulur
Migrasyon sırasında işletim	eski platformda C Operate	cut-over'a kadar stabil işletim; paralel çalışma
Lisans görünümü	ortam başına PowerCenter kullanımı	IDMC lisansı ve IPU boyutlandırma girdisi

Taşınırken işletim.
Migrasyon sırasında eski platform çalışmaya devam eder. C Operate cut-over'a kadar onu kapsar ve modül modül azaltılır; migrasyon ekibi tek bir operasyonel bilgi kaynağına sahip olur.

IDMC boyutlandırma. «DAMALINK DOĞRULASIN»
IDMC için IPU boyutlandırması P1'deki envanter sayılarına ve çalışma sürelerine dayanır. PowerCenter → IDMC dönüşüm araçları ve koşulları «ALAN».

Kademeler — Health Check, Transition, Operate

KOMTAS

A mevcut durumu çıkarır ve operasyon modelini önerir; B operasyonu devralır; C her ay işletir.

01 · KADEMELER

A — Platform Health Check

banda göre sabit bedel

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- kick-off, erişim, modül kapsamı
- envanter ve soru seti
- standart, performance, monitoring taraması
- yedi kategoride health skoru
- operasyon modeli önerisi, B ve C tahmini

S 3 · M 4 · L 6 hafta

B — Transition

sabit bedel, tek seferlik

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- mevcut ekipten knowledge transfer
- runbook'lar ve operasyon dokümanları
- monitoring kurulumu, SLA baseline
- ticket akışı, priority, escalation
- shadow, reverse shadow, devir

S ~15 · M ~30 · L ~50 kg + shadow

C — Operate

aylık

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- package: SLA + ticket veya saat havuzu
- dedicated: ekipte FTE uzmanlar
- hybrid: çekirdek FTE + SLA havuzu
- incident, change, performance, capacity
- aylık SLA raporu

asgari 12 ay (taslak)

MODÜLLER — A KAPSAMINDA VE C'DE SEÇİLİR

Informatica | Teradata | BI | DWH

Giriş noktası. Müşterilerin çoğu A ile başlar. Operasyonu dokümante olan bir müşteri eşdeğer bir envanterle B'den başlayabilir. A veya B'den gelen monitoring baseline'ı olmadan C önerilmez.


A — Platform Health Check: Akış ve Takvim

KOMTAS

P0–P4 fazlarında kick-off, inceleme, değerlendirme, rapor ve operasyon modeli önerisi. Banda göre sabit bedel.

02 · KADEME A

PLAN · BANT M, 4 HAFTA

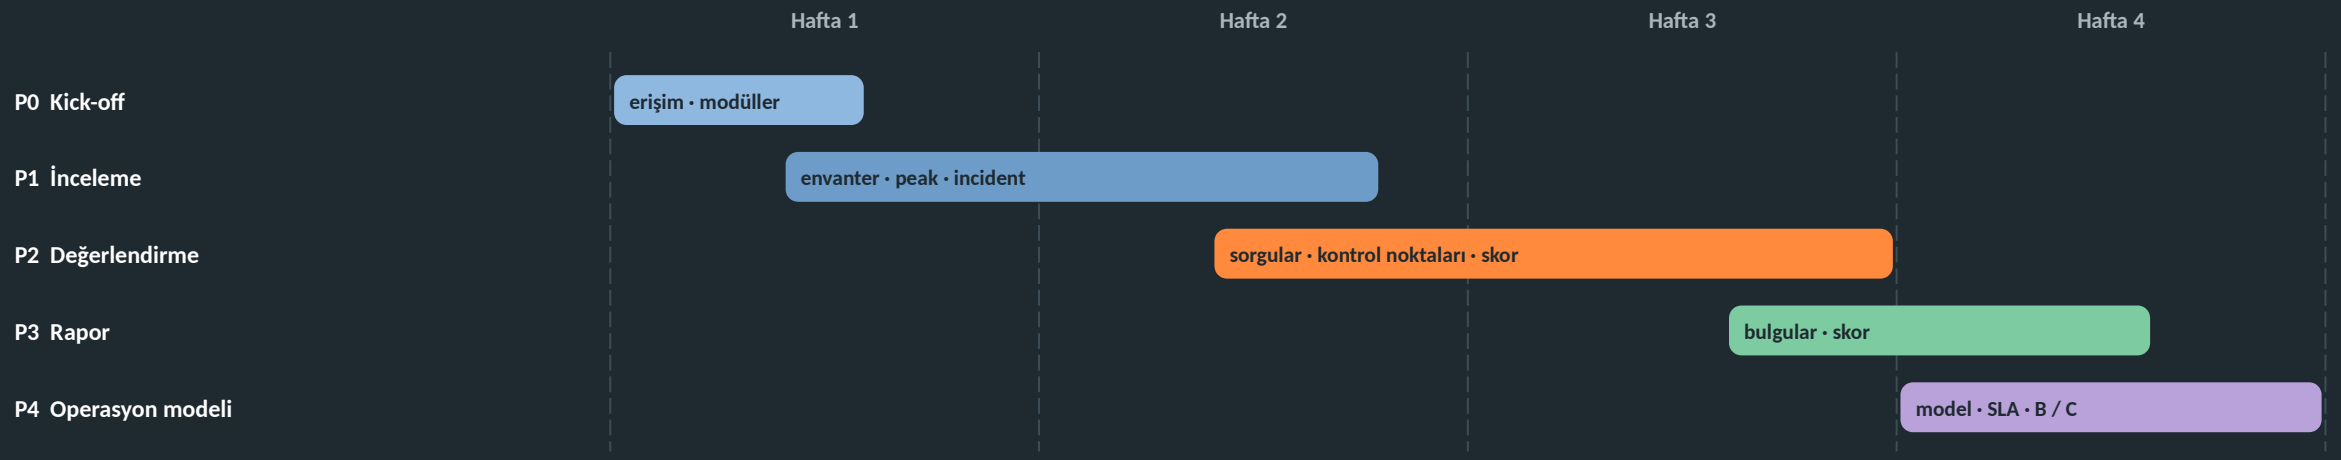

Bant S 3 hafta / ~15 kg, bant M 4 hafta / ~25 kg, bant L 6 hafta / ~40 kg. Tam assessment için Damalink referansı: 1–2 ay. «DAMALINK DOĞRULASIN»

B VE C İÇİN KARAR

Operasyon modeli ve B / C tahmini

Rapor hizmet modelini, modülleri, SLA önerisini, destek penceresini, ekibi ve geçiş planını; B ve C tahminini ve migrasyon hazırlık notunu içerir. Karar müşterinindir.

ÇIKTILAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Gereksinim dokümanı
- Envanter
- Bulgu listesi
- Health skoru
- Standart ve monitoring sonuçları
- Operasyon modeli önerisi

Ön koşul. Repository, log ve schedule'lara read-only erişim veya müşterinin çalıştırdığı mutabık sorgu çıktıları. İkisi de yoksa A bloklanır.

Health Check Skorlaması — Yedi Kategori

KOMTAS

Sorular kategori başına 0–5 yanıtlanır ve modül başına 5 üzerinden ağırlıklı skora çevrilir. Damalink assessment kalıbı, tüm modüllere genişletildi.

KATEGORİLER VE AĞIRLIKLAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

KATEGORİ	AĞIRLIK	NE KONTROL EDİLİR
Mimari	%10	ortamlar, HA / DR, kaynaklar, sürümler
Geliştirme	%20	yeniden kullanım, ekip geliştirme, versioning
Standartlar	%20	isimlendirme, parametre, açıklama, hard-coding
Deployment	%10	promotion yöntemi, ön kontroller, rollback
Performance	%10	darboğazlar, pushdown, cache'ler, uzun çalışmalar
Stabilite ve bakım	%20	peak yük, hatalı ve zombie job'lar, disk, log
Güvenlik ve kullanıcı yönetimi	%10	LDAP, gruplar, roller, ortak ve admin kullanıcılar

Ağırlıklı skor.
0–5 ölçeğinde Σ (kategori ortalaması × ağırlık); modül başına bir skor. Her bulgu kritiklik ve öneri taşır; quick win'ler ayrıca listelenir.

Yanıt başına kanıt.
Görüşmeler ve soru seti, repository sorguları, session log'ları, schedule'lar ve incident geçmişi. Her yanıt kaynağını kaydeder; kanıtsız beyanlar işaretlenir.

0–5 ÖLÇEĞİ «DAMALINK DOĞRULASIN»

- **0** yok
- **1** plansız, kişiye bağlı
- **2** kısmen tanımlı
- **3** tanımlı, kontrol edilmiyor
- **4** tanımlı ve kontrol ediliyor
- **5** otomatik kontrol ediliyor

Teradata, BI, DWH'a genişletme. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Aynı yedi kategori; sorular modül başına yeniden yazılır (ör. Teradata için workload rule'ları, BI için refresh ve gateway). Modül başına ağırlıklar «ALAN».

Standartlar, Performance Kontrol Noktaları, Deployment Checklist'i

KOMTAS

P2'de çalışan read-only kontroller. Sonuçlar bulgu listesine ve skora gider; aynı kontroller C'de monitoring'i besler.

02 · KADEME A

Standart sorguları

operasyonel ~25 · governance ~30

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- geçersiz veya kullanılmayan nesneler
- zombie workflow, sıfır satırlı çalışma
- threshold üstü reject satırlar
- aşırı büyük workflow ve mapping'ler
- hard-coded path, pre / post SQL
- nesne tipine göre isimlendirme
- açıklama, shortcut, parametre

repository sorguları + komut satırı

Performance kontrol noktaları

session log'ları ve ayarlardan

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- source / target / transformation busy %
- commit interval, bulk veya normal load
- SQL override, source filter
- lookup, joiner, aggregator cache'leri
- sorter temp I/O, sequence cache
- pushdown, DTM buffer, partitioning

session log parser

Deployment checklist'i

production'a promotion öncesi

«DAMALINK DOĞRULASIN»

- mapping geliştirme kontrolleri
- tipe göre transformation kontrolleri
- workflow ve session ayarları
- geliştirici unit test kanıtı
- deployment group veya export / import
- rollback yöntemi

mümkün olan yerde otomatik

Informatica dışında. Teradata, BI ve DWH modüllerinde aynı üç kontrol A'da platform başına yazılır; ör. skew ve istatistikler, refresh hataları, yükleme zinciri boşlukları. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

PowerCenter Monitoring Accelerator

KOMTAS

PowerCenter repository üzerinde rule tabanlı monitoring: ağırlık, threshold ve sorumlu atanmış, genişletilebilir hazır rule'lar. B'de kurulur, C'de işletilir.

02 · MONITORING

NEYİ TESPİT EDER «DAMALINK DOĞRULASIN»

Hatalı çalışmalar
workflow ve session'lar

Reject kayıtlar
threshold üzerinde

Süre sapması
ortalamadan uzun veya kısa

Satır sayısı sapması
ortalamadan fazla veya az satır

Zombie ve sıfır satırlı
takılan çalışmalar, boş tamamlananlar

Standart ihlalleri
isimlendirme, geçersiz nesneler

Tasarım riskleri
SQL override, pushdown kullanımı

YAKLAŞIM «DAMALINK DOĞRULASIN»

1 **Define**
metrikler, kategoriler, ağırlıklar, threshold'lar, sorumlular, yeni rule sorguları

2 **Measure**
sorguları çalıştır, nesneye drill-down, birden fazla metriği izle

3 **Manage**
schedule, rapor, alert, log ve yetkiler, yeni rule ekleme

İÇERİK

37 rule, iki aile «DAMALINK DOĞRULASIN»

Operasyonel: performance ve bakım. Governance: performance, bakım, standartlar. Her rule: kategori, kritik işareti, ağırlık, threshold, schedule, e-posta.

Dashboard ve alert'ler

Kategori bazında sağlık, hatalı nesneye drill-down, kritik rule'lar için e-posta alert'i, log ve kullanıcı yetkileri.

IDMC karşılığı «DAMALINK DOĞRULASIN»

Yalnızca on-prem PowerCenter. IDMC'de: Operational Insights ve yerleşik monitoring «ALAN».

Partner IP'si. Damalink IP'si; Komtaş sözleşmelerinde kullanım koşulları «ALAN». Mutabakat olmazsa kontroller Komtaş sorguları olarak yeniden yazılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

B — Transition

sabit bedel, tek seferlik

KOMTAS

Operasyonun mevcut ekipten veya tedarikçiden devralınması. Shadow döneminden sonra devir onayıyla kabul edilir.

Ön koşul: bir Platform Health Check veya eşdeğer bir envanter «A REF».

İŞ AKIŞLARI «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Knowledge transfer** — mevcut ekip veya tedarikçiyle oturumlar
- **Runbook'lar** — modül başına operasyon dokümanları
- **Monitoring kurulumu** — rule, alert; Informatica'da Accelerator
- **SLA baseline** — hedefler belirlenmeden önce ölçülür
- **Ticket akışı** — priority ve escalation matrisleri
- **Erişim ve araçlar** — hesaplar, VPN, ticket aracı, log'lar

EFOR FORMÜLÜ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

B EFORU (kg)

banda göre iş akışları + shadow dönemi + opsiyonel kalem

BANDA GÖRE İŞ AKIŞLARI

S ~15 kg · M ~30 kg · L ~50 kg

SHADOW

«SAYI» hafta shadow, ardından reverse shadow

Opsiyonel kalem «OPSİYONEL». «DAMALINK DOĞRULASIN»
Platform taşıma veya upgrade; ör. Informatica sunucu taşıma veya sürüm upgrade'i (Odeabank tipi talep).

GEÇİŞ FAZLARI «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

FAZ	İÇERİK	ÇIKIŞ	İŞLETEN
Hazırlık	erişim, araçlar, plan	erişim verildi	ikisi
Knowledge transfer	oturumlar, runbook'lar	runbook'lar gözden geçirildi	mevcut
Shadow	mevcut ekip işletir, Komtaş izler	«SAYI» hafta	mevcut
Reverse shadow	Komtaş işletir, mevcut ekip izler	açık P1 yok	Komtaş
Devir	onay; SLA başlar	imzalandı	Komtaş

Shadow süresi doküman seviyesine ve modül sayısına bağlıdır.

C — Operate: Üç Hizmet Modeli

KOMTAS

SLA altında aylık operasyon. Model A'da önerilir, teklifte seçilir; modüller model içinde eklenir.

03 · KADEME C

«MODEL — PACKAGE»

SLA + aylık ticket veya saat havuzu

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- SLA kataloğundaki hizmetler
- havuz S 80 · M 160 · L 320 saat / ay
- kullanılmayan saat devretmez
- priority matrisi P1–P4
- aylık SLA raporu

fiyatlama yapısı «ALAN»

«MODEL — DEDICATED»

müşteri ekibinde FTE uzmanlar

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- FTE listesindeki roller (s. 19)
- kıdem seviyeleri
- değişim ve süreklilik kuralları
- günlük işi müşteri yönlendirir
- Digiturk tipi talep

fiyatlama yapısı «ALAN»

«MODEL — HYBRID»

çekirdek FTE + SLA havuzu

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- günlük işletim için çekirdek FTE
- peak'ler ve diğer modüller için havuz
- tek service manager
- havuz hizmetlerinde SLA
- tek aylık rapor

fiyatlama yapısı «ALAN»

Süre. Taslak asgari süre 12 ay. Kullanılmayan havuz saatleri devretmez; havuz üstü iş saat ücretiyle faturalanır «ALAN». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Modüller — Informatica, Teradata, BI, DWH

KOMTAS

A kapsamında ve C'de seçilir. Her modülün kendi lead'i, kontrolleri ve runbook'ları vardır.

«MODÜL — INFORMATICA»
«DAMALINK DOĞRULASIN»

- PowerCenter ve IDMC operasyonu
- Monitoring Accelerator
- standart ve deployment kontrolleri
- upgrade ve patch desteği
- sunucu taşıma «OPSİYONEL»

Damalink yöntemi

«MODÜL — TERADATA»
«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- workload yönetimi
- performance tuning
- alan ve capacity
- istatistikler
- yedekleme koordinasyonu

Körfez referansları

«MODÜL — BI»
«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects
- rapor hataları, refresh schedule'ları
- gateway, kullanıcı, yetkilendirme
- universe / semantic model değişiklikleri
- rapor performance'ı

havayolu, üretim

«MODÜL — DWH»
«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- yükleme zinciri izleme
- veri modeli değişiklikleri
- veri kalitesi kontrolleri
- Oracle, SQL Server
- cloud warehouse'lar

platform listesi «PLATFORM»

HER KADEME MODÜL BAŞINA NE YAPAR «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KADEME	INFORMATICA	TERADATA	BI	DWH
A	standart sorguları, checklist, rule taraması	workload, skew, alan, istatistik incelemesi	refresh hataları, gateway, kullanım incelemesi	yükleme zinciri, model, DQ kontrol incelemesi
B	Accelerator kurulumu, runbook'lar	workload ve alan runbook'ları	refresh ve gateway runbook'ları	yükleme zinciri runbook'ları
C	hatalar, deployment'lar, upgrade'ler	tuning, capacity, istatistikler	hatalar, refresh, kullanıcılar, change'ler	yüklemeler, model değişikliği, DQ

A'da seçilmeyen modüller, kısa bir modül health check'inden sonra C'de eklenebilir.

Teknoloji Seçenekleri — On-prem ve Cloud

KOMTAS

Damalink materyali on-prem PowerCenter 10.x'i kapsar. IDMC ve cloud karşılıkları taslaktır ve teyit edilmelidir. Platform listesi bir kapsam kalemidir «PLATFORM».

İHTİYACA GÖRE PLATFORMLAR «DAMALINK DOĞRULASIN»

İHTİYAÇ	ON-PREM	CLOUD / IDMC
Veri entegrasyonu	Informatica PowerCenter	IDMC Cloud Data Integration
Monitoring	repository sorguları; Monitoring Accelerator	IDMC Operational Insights «ALAN»
Deployment	deployment group'lar, komut satırı araçları	IDMC asset export / import «ALAN»
Data warehouse	Teradata, Oracle, SQL Server	cloud warehouse'lar, ör. BigQuery «PLATFORM»
BI	Power BI Report Server, Qlik Sense, SAP BusinessObjects	Power BI service, Qlik Cloud «PLATFORM»

Müşteri başına seçim «PLATFORM».
Platform listesi A kapsamında netleşir. Migrasyon sırasında PowerCenter ve IDMC yan yana çalışabilir; C ikisini de kapsar.

Destek durumu. «DAMALINK DOĞRULASIN»
PowerCenter 10.x'in destek durumu ve IDMC monitoring kapsamı «ALAN»; her tekliften önce Informatica ile kontrol edilir.

SLA ve Hizmet Kataloğu — Hizmetler

KOMTAS

Beş temel ve üç opsiyonel hizmet. Her hizmetin tanımı ve kapsamı, tetikleyicisi, çıktısı ve ölçütü vardır.

HİZMET KATALOĞU «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

HİZMET	TANIM VE KAPSAM	TETİKLEYİCİ	ÇIKTI	ÖLÇÜT
Incident yönetimi	hatalı job, yükleme ve raporların geri getirilmesi; workaround, kök neden notu	alert veya ticket	düzelen çalışma, incident kaydı	priority'ye göre response ve resolution
Change ve minor enhancement	havuzdan küçük değişiklikler: mapping, rapor, schedule	change talebi	test edilmiş change, deployment	mutabık tarihte teslim
Performance yönetimi	uzun süren job'lar ve yavaş raporlar analiz edilip iyileştirilir	threshold veya talep	tuning, önce / sonra süreleri	çalışma süresi trendi
Capacity yönetimi	alan, CPU, lisans ve yükleme penceresi payı izlenir	aylık gözden geçirme, threshold	capacity notu, aksiyonlar	threshold'a göre pay
Raporlama	aylık SLA raporu, trendler, iyileştirme backlog'u	ay sonu	SLA raporu	zamanında, kabul edildi
Problem yön. «OPSİYONEL»	tekrarlayan incident'ların kök nedene izlenmesi	tekrar eden incident	problem kaydı, çözüm	tekrar eden incident'lar
Release desteği «OPSİYONEL»	kontrollerle production'a release ve deployment	release planı	yayınlanan release, checklist	hatalı deployment'lar
On-call «OPSİYONEL»	destek penceresi dışında response	mesai dışı P1 / P2	incident kaydı	on-call response

Hizmet başına.
Her hizmet teklif ekinde tanım, kapsam, tetikleyici, çıktı ve ölçütle yazılır; hedefler B'deki SLA baseline'ından sonra mutabık kalınır.

Katalogda olmayanlar.
Altyapı, OS, DBA, network ve lisans işleri; minor enhancement havuzu dışındaki yeni geliştirme.

SLA ve Hizmet Kataloğu — Priority, Pencere, Escalation

KOMTAS

Hedefler SLA baseline'ı ölçülene kadar yer tutucu kalır. Service credit'ler ve yapıları sözleşme başına netleşir.

PRIORITY MATRİSİ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

PRIORITY	TANIM	ÖRNEK	RESPONSE	RESOLUTION
P1	kritik yükleme veya rapor durdu; iş durdu	ay sonu veya yasal yükleme hatalı	«SAYI» saat	«SAYI» saat
P2	önemli fonksiyon bozuk; workaround zor	günlük DWH yüklemesi gecikti	«SAYI» saat	«SAYI» saat
P3	sınırlı etki; workaround var	tek bir rapor hatalı	«SAYI» saat	«SAYI» gün
P4	talep veya soru	yeni kullanıcı, küçük değişiklik	«SAYI» gün	plana göre

DESTEK PENCERELERİ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

8×5 mesai saatleri, iş günleri

12×5 uzatılmış saatler «OPSİYONEL»

24×7 P1 / P2 için on-call «OPSİYONEL»

ESCALATION SEVİYELERİ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1. **Operatör** ticket sahibi
2. **Modül lead'i** teknik escalation
3. **Service manager** SLA ve müşteri muhatabı
4. **Yönlendirme kurulu** platform sahibi ve Komtaş yönetimi

CREDIT VE RAPORLAMA

Service credit'ler «ALAN».
Yapı ve üst sınırlar sözleşme başına netleşir.

Aylık SLA raporu.
priority'ye göre ticket'lar, tutan hedefler, trendler, capacity, backlog

Ekip ve Roller

KOMTAS

Hizmeti bir service manager, modül lead'leri ve operatör / geliştiricilerle yürütür; dedicated model müşteri ekibine yerleşen FTE rolleri ekler.

ROLLER «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

ROL	SORUMLULUK	A	B	C
Service manager	SLA, aylık rapor, escalation, müşteri muhatapları	lead	lead	lead
Health check lead'i	yöntem, görüşmeler, skor, operasyon modeli önerisi	●	kısmi	—
Modül lead'leri	Informatica, Teradata, BI, DWH kontrolleri ve runbook'ları	●	●	●
Operatör / geliştirici	incident, change, monitoring, minor enhancement	kısmi	●	●
Dedicated FTE	aşağıdaki roller, müşteri ekibine yerleşik	—	kısmi	●

● katılır lead teslimattan sorumlu kısmi yarı zamanlı — atanmaz

MÜŞTERİ TARAFI MUHATAPLAR «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Platform sahibi
hizmet sahibi, onay

İş sahipleri
öncelikler, rapor kullanıcıları

Altyapı / DBA
sunucular, veritabanları, erişim

Güvenlik
hesaplar, onaylar, denetim

Dedicated FTE rolleri. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
DWH / BI geliştirici · ETL geliştirici · veri modelci · mimar · analist · Teradata uzmanı · Informatica yöneticisi. Kıdem seviyeleri, değişim ve süreklilik kuralları «ALAN».

Toplanacak kadro bilgileri.
Role göre mevcut FTE «SAYI» · partner payı «ALAN» · yerinde veya uzaktan «ALAN»

Boyutlandırma — Sürücüler, Bantlar ve Efor

taslak — kalibre edilecek

KOMTAS

Sürücüler girdi formlarından gelir (dosya 3a–3c). Süre hafta, efor kişi-gün (kg), havuzlar aylık saat olarak.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜLERİ «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SÜRÜCÜ	S	M	L
Modüller	1	2	≥3
Job / workflow	≤300	301–1.500	>1.500
Rapor / BI kullanıcısı	≤100 / ≤200	101–500 / 201–1.000	>500 / >1.000
Ortamlar	1–2	3	≥4
Destek penceresi	8×5	12×5	24×7
Aylık ticket (ort.)	≤40	41–150	>150

Bant kuralı. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. Dedicated model bantla değil FTE ile boyutlandırılır.

Dedicated ve hybrid. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Role göre FTE sayısı 3c girdi formundan; hybrid = çekirdek FTE + havuz bandı. 3c capacity hesaplayıcısı bant ve modüle göre havuz saatini verir.

SÜRE / EFOR «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KALEM	S	M	L
A süresi	3 hafta	4 hafta	6 hafta
A eforu	~15 kg	~25 kg	~40 kg
B eforu	~15 kg	~30 kg	~50 kg
B shadow	«SAYI» hafta	«SAYI» hafta	«SAYI» hafta
C package havuzu	80 saat / ay	160 saat / ay	320 saat / ay
C dedicated	«SAYI» FTE	«SAYI» FTE	«SAYI» FTE
C hybrid	FTE + havuz	FTE + havuz	FTE + havuz

Modüller Modüller bir sürücü olarak sayılır; bedeller «...». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kalibrasyon.
Taslak. A, Damalink assessment süresine göre kalibre edildi; B ve C, Digitallency'nin operasyon sözleşmeleriyle kalibre edilecek.

Acceptance Kriterleri

KOMTAS

Her kademe mutabık kanıtla kabul edilir. SLA hedefleri baseline'dan sonra belirlenir; önceden hiçbiri taahhüt edilmez.

ACCEPTANCE ADIMLARI

1. **Kriterler netleşir**
   kademe başına, başta, platform sahibiyle
2. **Kanıt toplanır**
   rapor, runbook'lar, onay formu, SLA raporu
3. **Gözden geçirme**
   açık konular düzeltilir veya açıklanır
4. **Onay**
   platform sahibi

KRİTERLER «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KADEME / KALEM	KRİTER	KANIT	EŞİK
A	Health Check raporu kabul edildi	rapor, kapanış sunumu	kapanış sunumunda kabul
B runbook'lar	modül başına runbook'lar incelendi	runbook seti	kapsamdaki tüm modüller
B baseline	SLA baseline'ı ölçüldü	baseline raporu	«SAYI» haftalık veri
B devir	reverse shadow sonrası devir	onay formu	açık P1 yok
C aylık	aylık SLA raporu kabul edildi	SLA raporu	her ay
C credit	service credit'ler mutabık şekilde uygulandı	SLA raporu	«ALAN»

Hedefler baseline'dan sonra.
Response ve resolution hedefleri B'deki SLA baseline'ından sonra belirlenir; öncesinde hiçbiri taahhüt edilmez.

Acceptance dışında.
Altyapı, kaynak sistem veya kapsam dışı platformlardan kaynaklanan hatalar kaydedilir ancak SLA'ya sayılmaz.

Hızlandırıcılar

KOMTAS

Altı yeniden kullanılabilir varlık. 1–5 Damalink framework'ünden gelir ve Komtaş yapısında yeniden yazılır; 6 Komtaş şablonlarıdır.

03 · HIZLANDIRICILAR

1 Health Check skorlama modeli

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Yedi ağırlıklı kategori, 0–5 sorular, modül başına ağırlıklı skor.

mimari · geliştirme · standartlar · deployment · performance · stabilite · güvenlik

Damalink kalıbı; genişletme yeni — A

2 Standart sorguları ve deployment checklist'i

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Operasyonel ve governance repository sorguları; promotion öncesi kontroller.

~25 operasyonel · ~30 governance sorgusu · nesneye göre checklist

Damalink sorgu seti — A · B

3 Performance kontrol noktaları

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Session log'ları ve ayarlardan okunan kontroller ve threshold'lar.

busy % · cache · commit · pushdown · buffer · log parser

Damalink kontrol noktaları — A · C

4 PowerCenter Monitoring Accelerator

«DAMALINK DOĞRULASIN»

Repository üzerinde ağırlık, threshold, alert ve dashboard'lu 37 rule.

operasyonel ve governance rule'ları · drill-down · e-posta alert'i

Damalink IP'si; koşullar «ALAN» — B · C

5 Soru setleri

«DAMALINK DOĞRULASIN»

A görüşmeleri ve girdi formları için gereksinim ve geliştirici / operatör soruları.

mimari · stabilite · performance · deployment · güvenlik · alert

Damalink'ten yeniden yazıldı — A

6 Runbook, SLA ve rapor şablonları

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Modül başına runbook, geçiş planı, SLA kataloğu ve aylık rapor.

runbook'lar · geçiş planı · SLA kataloğu · aylık rapor

Komtaş şablonları — B · C

Kopyalanmadı, yeniden yazıldı. Altısı da Komtaş yapısına ve diline uyarlanır. Damalink orijinallerinin tekliflerde kullanımı, adları geçmeden önce netleştirilir.

Devam İşi Haritası

KOMTAS

Her kademe adı konmuş bir sonraki adıma bağlanır. Teklif şablonlarında bu, partner koşulları olmadan 'Sonraki adım' bölümüdür.

SONRA → SONRAKİ ADIM «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

SONRA	SONRAKİ ADIM	TÜR
A raporu	B Transition, ardından C Operate	hizmet projesi
A envanteri, migrasyon planlı	etl-migration-gcp (legacy ETL → GCP)	paket
PowerCenter destek dışı veya lisans incelemesi	PowerCenter → IDMC migrasyonu; lisans / IPU	proje + lisans
C çalışıyor	ek modüller veya başka model (havuz → hybrid)	tekrarlayan hizmet
Birden fazla paket Run kademesi	C altında birleştirilir	tekrarlayan hizmet
Mimari sorular	dwh-assessment	paket
Standart ve sahiplik bulguları	data-governance	paket
Körfez bölgesinde müşteri	Digitallency ile bölgesel operasyon teklifi «ALAN»	program

Teklif şablonlarında.
'Sonraki adım' bölümü: migrasyon hazırlığı (etl-migration-gcp, IDMC), ek modüller, Run kademelerinin birleştirilmesi. Partner koşulu ve fiyat yok.

Tekrarlayan değer.
C hesabı bağlar; envanter ve işletim bilgisi Komtaş'ı migrasyon için konumlandırır.

Riskler ve Açık Konular

KOMTAS

Taslak hâliyle paketin bilinen riskleri, nasıl ele alındıkları ve hâlâ açık olan sorular.

RİSKLER «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

RİSK	ETKİ	ELE ALMA
Dokümante olmayan ortamlar	uzun knowledge transfer; gizli job'lar	A'da envanter; B'de runbook; doküman seviyesine göre shadow
Bilginin birkaç kişide olması	devralmada boşluklar	rol başına knowledge transfer planı; reverse shadow
Erişim ve güvenlik onayları	geç başlangıç, bloklu kontroller	P0'da erişim listesi; yedek olarak müşterinin çalıştırdığı sorgular
Monitoring baseline'ı olmadan SLA	ilk günden kaçan hedefler	B'de baseline; hedefler baseline'dan sonra
Partner IP koşulları	Accelerator veya sorgular kullanılamaz	koşulları netleştir; gerekirse Komtaş sorgusu olarak yeniden yaz
Eski referanslar	referanslar eski veya kullanılamaz	Digitallency yılları ve izni teyit eder

SAHİBİNE GÖRE AÇIK KONULAR

Damalink

- Yöntem güncel mi; IDMC karşılıkları?
- Monitoring Accelerator koşulları
- Assessment süresi ve eforu
- Informatica delivery kapasitesi

Digitallency

- Referanslar: yıl, kapsam, izin
- SLA ve hizmet seviyesi pratiği
- Resourcing Hub rolleri, FTE modeli
- Teradata / BI / DWH kapasitesi

Satış ve yönetim

- Partnerlik modelleri
- Model başına fiyatlama yapısı
- Talep sinyallerinin takibi
- Körfez bölgesi yaklaşımı

Doğrulama Özeti

KOMTAS

Damalink ve Digitallency incelemesi için taslak. Taslak her ifade, sahibini gösteren turuncu bir etiket ve sidecar dosyasında bir soru taşır.

04 · DOĞRULAMA

BU DOSYADAKİ ETİKETLER

64

etiket, EN ve TR'de aynı sıra

DAMALINK 26 DIGITALLENCY 38

sidecar: data-platform-ops-1-blueprint-tr.json

BÖLÜME GÖRE ETİKETLER

Konumlandırma, kademeler	2 – 8	14
Health Check, monitoring	9 – 12	14
Transition, operasyon	13 – 18	19
Delivery, durum	19 – 25	17

PAKET DOSYALARI

		ETİKET
1	Blueprint (bu dosya)	64
2	Müşteri sunumu	«...»
3a–c	Girdi formları	«...»
4a–c	Teklif şablonları	«...»

Paket toplamı: «...» etiket; EN ve TR'de aynı.
Doküman başına bir sidecar dosyası; etiket başına bir soru; etiket başına sahip.

İNCELEME NASIL İŞLER

1. Her sahip sidecar'daki sorularını yanıtlar
2. Teyit: etiket kaldırılır; değişiklik: EN ve TR güncellenir
3. Yer tutucular doldurulur: «ALAN», «SAYI», «PLATFORM»
4. Süre, efor, havuz, SLA hedefi ve IDMC adları yeniden kalibre edilir

Bilinen bilgiler etiket taşımaz: Damalink framework materyalinin yapısı ve tarihleri, Digitallency sunumunda adı geçen referanslar, RFP klasöründeki talep sinyalleri; partnerlik modelleri açık.
